





ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ

Χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των έξι (6) Δεσμών εργασίας.

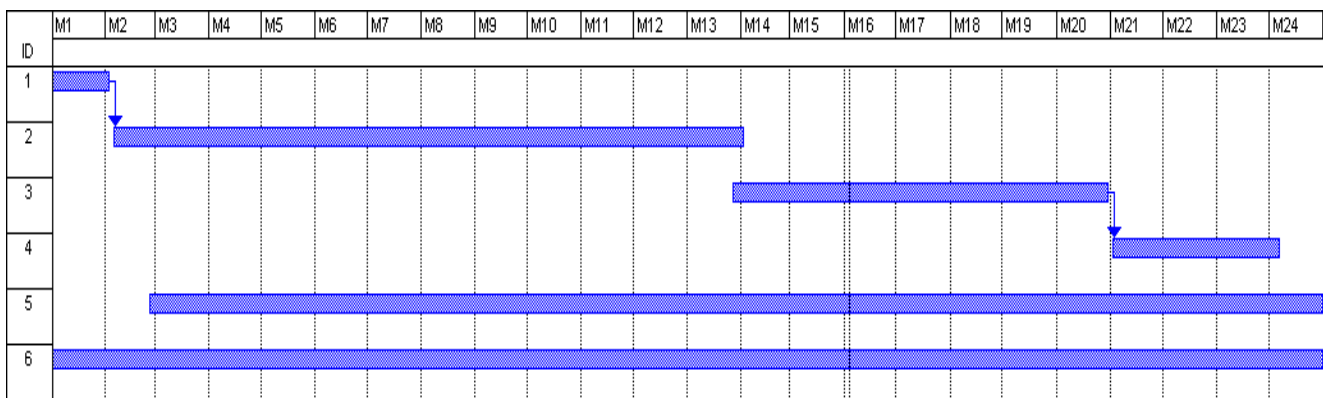

Η πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζει τη διασύνδεση των δεσμών εργασίας

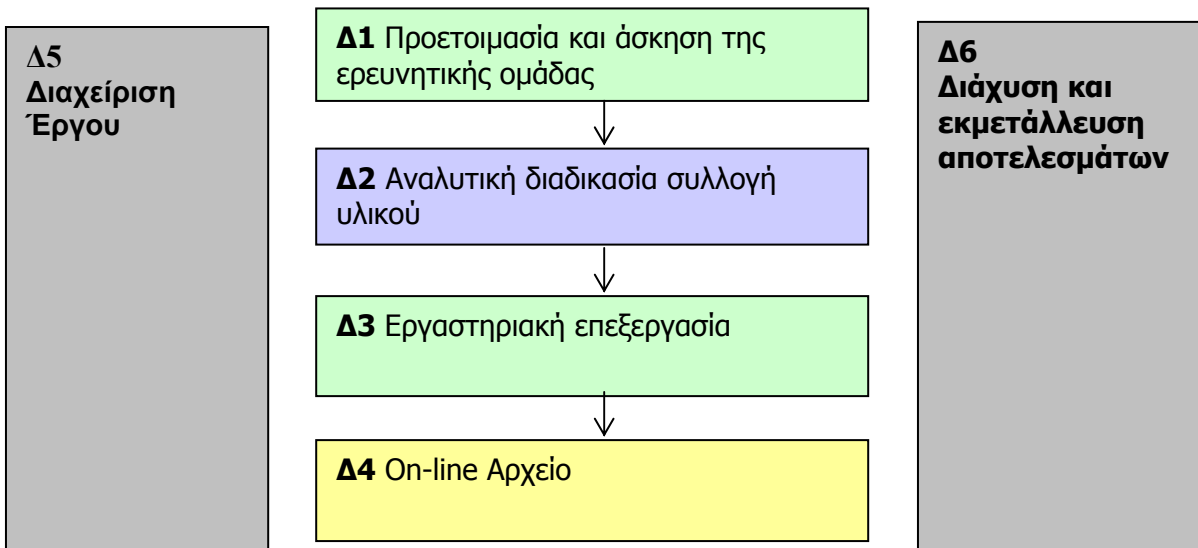



Δ1 Προετοιμασία και άσκηση της ερευνητικής ομάδας.

Οι εργασίες της δέσμης εκτελούνται κατά τον 1^ο μήνα από τον ΕΥ και τον Σ.Ε. αρ.1 του Α.Φ.

Δ2 Αναλυτική διαδικασία συλλογή υλικού

Οι εργασίες της δέσμης εκτελούνται από τον 2^ο μέχρι και τον 13^ο μήνα (σύνολο 12 μήνες) από τον Ε.Υ. και τους τρεις συνεργάτες του Σ.Φ.1

Δ3 Εργαστηριακή επεξεργασία.

Οι εργασίες της δέσμης εκτελούνται από τον 14^ο μέχρι τον 20^ο μήνα (σύνολο 7 μήνες) από τον Ε.Υ., τον Σ.Ε. αρ.2 του Α.Φ., τους τρεις Σ.Ε. του Σ.Φ.1 και τον Σ.Ε. του Σ.Φ.2

Δ4 On-line Αρχείο

Οι εργασίες της δέσμης εκτελούνται από τον 21^ο μέχρι τον 24^ο μήνα (σύνολο 4 μήνες) από τον Ε.Υ, τον Σ.Ε. αρ.3 του Α.Φ. και τον Σ.Ι.Ε.

Δ5 Διαχείριση Έργου

Οι εργασίες της δέσμης εκτελούνται από την αρχή μέχρι και τον τελευταίο μήνα (σύνολο 24 μήνες) από τον Ε.Υ. και τον Σ.Ε. αρ.3 του Α.Φ.

Δ6 Διάχυση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων

Οι εργασίες της δέσμης από την αρχή μέχρι και τον τελευταίο μήνα (σύνολο 24 μήνες) από τον Ε.Υ., τους τρεις Σ.Ε. του Α.Φ., τους τρεις Σ.Ε. του Σ.Φ.1, τον Σ.Ε. του Σ.Φ.2 και τον Τ.Χ. και Π.Β.



Πίνακας με Δέσμες Εργασίας

Αρ. Δέσμης Εργασίας ¹²	Τίτλος Δέσμης Εργασίας	Ανθρωπ ο- μήνες ¹³	Αρχή Μήνας ¹ ⁴	Τέλος – Μήνας ¹ ⁵	Αριθμός Παραδοτέου ¹⁶
1	Προετοιμασία και άσκηση της ερευνητικής ομάδας	1	0	1	Π1- Π5
2	Αναλυτική διαδικασία συλλογής του υλικού	12	1	13	Π6-Π8
3	Εργαστηριακή Επεξεργασία	12	14	20	Π9-Π13
4	Online Αρχείο	3	21	24	Π14
5	Διαχείριση έργου	4	0	24	Π15-Π17
6	Διάχυση / εκμετάλλευση αποτελεσμάτων	1	1	24	Π18
